



Serbatoio ed opere derivate per la sistemazione dell'acquedotto nelle contrade Volante e Farina della frazione Gallinaro in S. Donato P.C., prov. di Grosseto.

Relazione di Collaudo

Con lettera del 7-10-1933 XI, il sottoscritto ing. Felice Santoro di Albito veniva incaricato dal Sig. Podestà di S. Donato P.C. di collaudare i lavori eseguiti dalla Ditta Corrado Fabrizio in Gallinaro per la sistemazione dell'acquedotto nelle contrade Volante e Farina e per la costruzione del relativo serbatoio.

Esaminati i documenti esibiti, eseguita la visita di collaudo, il sottoscritto rimette la seguente Relazione. Il Podestà del Comune di S. Donato P.C. aveva fatto redigere un progetto per i lavori di cui sopra dall'ing. Umberto Berenzio di Settefrati, senonché data l'urgenza di dotare d'acqua potabile le due importanti contrade, ed allo scopo di andare subito incontro alle disoccupazioni degli

opere locali, non si aspettò la preventiva autorizzazione ed approvazione da parte delle autorità competenti al progetto di cui sopra.

Inoltre, poiché non si poteva eseguire subito e totalmente il progetto Berengio, fu dato incarico all'ing. Donato Benfesta di S. Donato di redigere una perizia - stralcio dal detto progetto dei lavori più urgenti. Con deliberazione podestarile del 22 settembre 1932 - A. I., i lavori risultanti dalla perizia stralcio furono concessi a trattativa privata in appalto alla Ditta Carmelo Fabrizio di S. Donato e la direzione di essi allo stesso ing. Donato Benfesta - sempre allo scopo di dar subito inizio ai lavori neanche questa deliberazione fu sottoposta alla relativa approvazione - I lavori appaltati consistevano nello scavo e costruzione di un serbatoio della capacità di circa 25 metri cubi, e nello scavo per le diramazioni della condotta alla contrada Casal Volante ed alla contrada Casal Farina - Il tutto per un importo presunto di lire



Serbatoio ed opere derivate per la sistemazione dell'acquedotto nelle contrade Volante e Farina della frazione Gallinara in S. Donato P. C., provincia di Grosseto -

Il sottoscritto ing. Felice Santoro di Abito
Certifica

che i lavori del serbatoio ed opere derivate per l'acquedotto nelle contrade Volante e Farina in S. Donato P. C., prov. di Grosseto, furono affidati a trattativa privata alla Ditta Carmelo Fabrizio con deliberazione podestarile del 22 settembre 1932 - X;

che l'importo dei lavori previsti nella perizia - stralcio dell'ing. Donato Benfesta era di lire dodicimila trecento cinquantasette cent. otto (L. 12357,08); che durante l'esecuzione il progetto subì degli aumenti di lavoro consistenti nella costruzione di due fontane e nella sostituzione di una volta in conglomerato cementizio armato al serbatoio previsto ed in forniture varie,

che il conto finale compilato dal direttore dei lavori ing. Donato Benfesta ammonta a lire quindicimila trecentoventuno e centesimi dodici;
che la visita di collaudo è stata eseguita dal sottoscritto il 9/1-34-III;
che esaminati i documenti esibiti, verificati i materiali impiegati;
il sottoscritto ritiene il tutto eseguito a regola d'arte e per tanto dichiara collaudabili i lavori anzidetti per un importo complessivo di lire quindicimila trecentoventuno e centesimi dodici
L. 15321, 12 -


Alto 20-1-34-III

ing. Felice Santoro


serbatoio

scala 1:50

Pianta

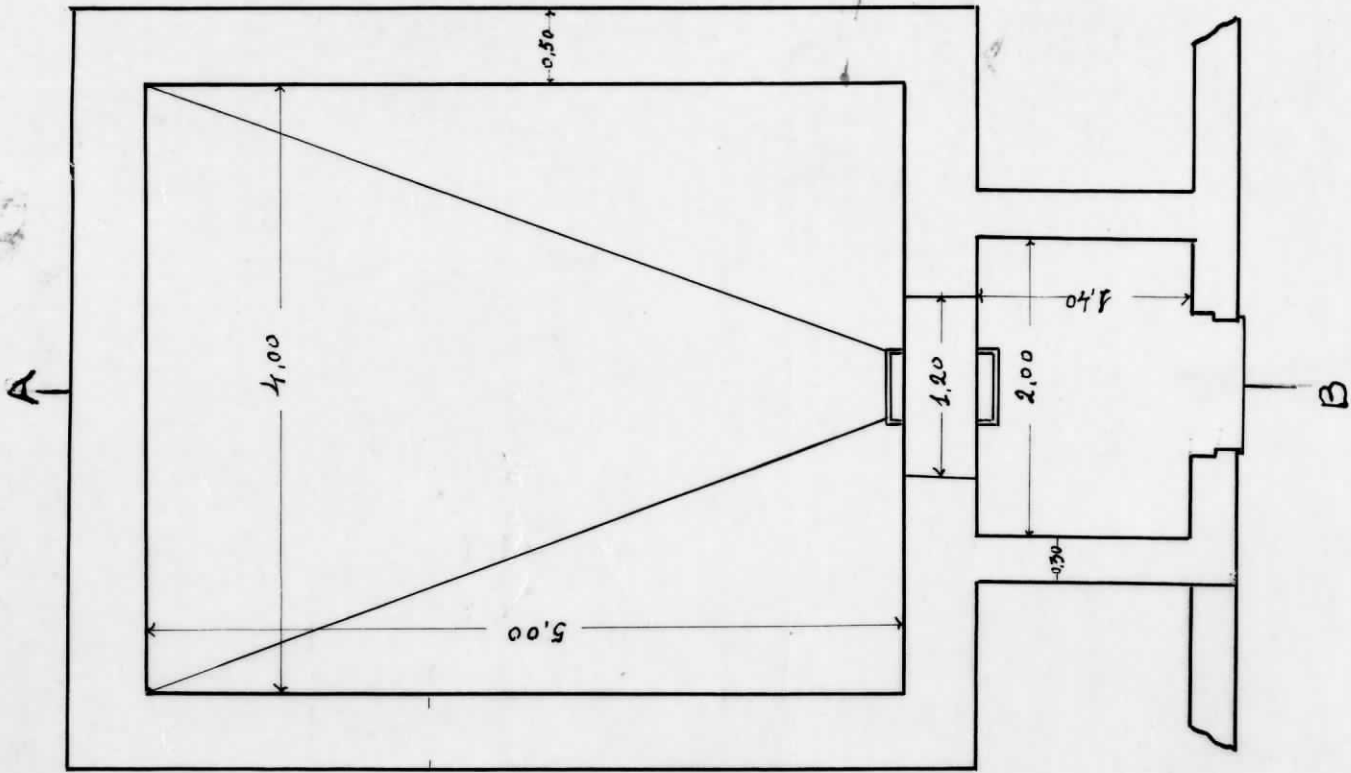

Sezione A-B

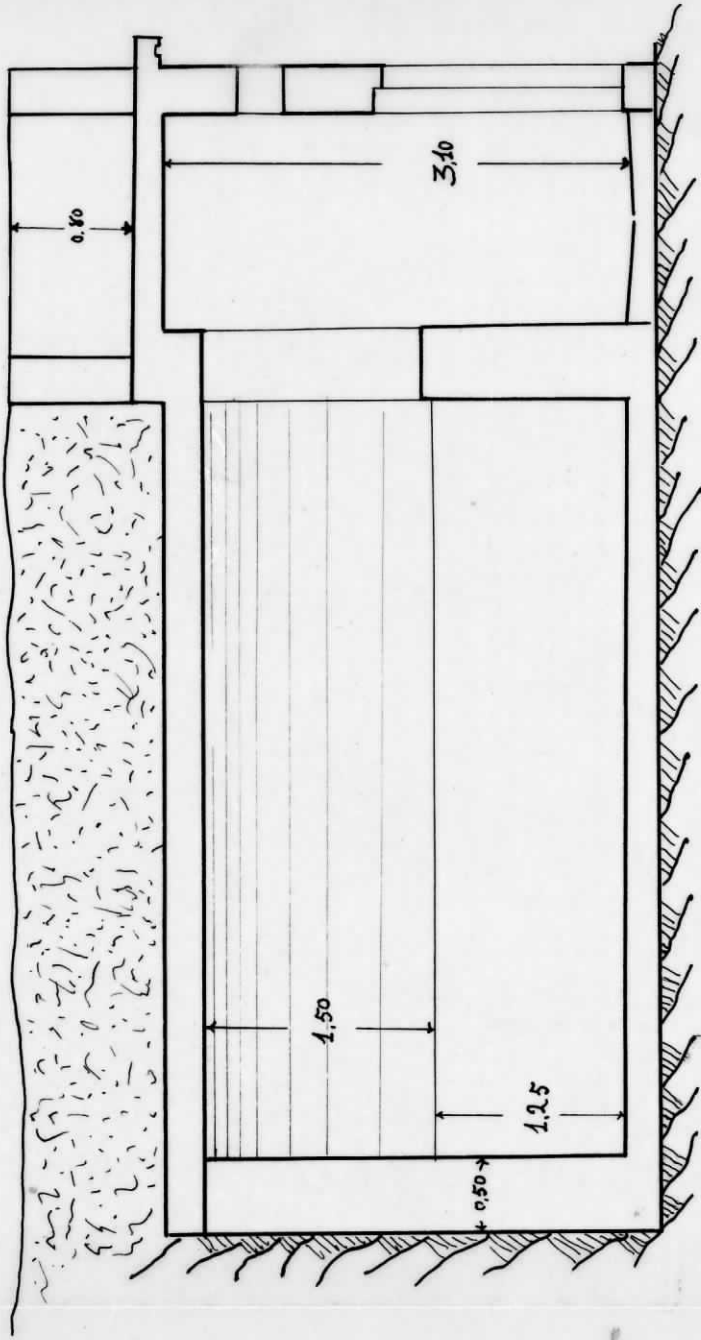

ing. Felice Santoro



dodicimila trecentocinquantesette e
centesimi otto (L. 12357,08) —

Durante l'esecuzione dei lavori, si ag-
giunse la costruzione di due fontanelle
ed al previsto solaio in cemento armato
per la copertura del serbatoio, fu sostituita
una volta circolare a botte in
in cemento armato. Inoltre la
Ditta costruttrice fece delle forniture
al comune per i lavori da quest'ultimo
eseguiti in economia a complemento
delle dette condutture.

L'importo quindi della contabilità
finale s'è elevato quindi a lire quin-
dicimila trecentoventuno e centesimi do-
dici (L. 15321,12) —

Il sottoscritto ha eseguito la visita di
collaudo il giorno 9-1-1934 - VIII ed ha
verificato i materiali impiegati, l'imper-
meabilità del serbatoio, e le misure alla
presenza del signor Carmelo Fabrizio.

Il tutto è stato eseguito a perfetta rego-
la d'arte, con buoni materiali e nei
termini previsti.

La contabilità finale corrisponde

nelle misure ai lavori eseguiti, e nei
prezzi a quelli fissati dal Capitolato
d'affalto. La Ditta costruttrice non
ha avanzato riserve -

Benchè richiesta, non mi è stata es-
bita la polizza d'assicurazione contro
gli infortuni degli operai addebi-
tati ai lavori. Mancando tra i documenti esibiti
mi, i disegni, il sottoscritto ha credu-
to opportuno fare un rilievo del
serbatoio, il cui disegno si allega alla
presente Relazione -

Alvito 20-1-34-XII

ing. Felice Sautero
